

003128

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública



ACUSE

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ORIG Y COPIA CIA

'18 APR 12 P2 54

El Saucillo, Huichapan, Hgo., 08/Marzo/2018.

OFICIO No. ITESHU/DG/186/2018.

~~MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO~~
~~DIRECTOR GENERAL DEL TECNM~~
~~PRESENTE~~

RECIBIDO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ATN:
LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Con base a lo solicitado referente al avance de obra del programa Escuelas al cien, envió a usted la información del instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en los formatos solicitados, con corte al mes de febrero de 2018.

Anexo al presente, sírvase encontrar:

- Reporte de avance de bienes
- Reporte de avance de obra
- Informe físico financiero con corte al mes de febrero de 2018

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE




ING. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA
DIRECTORA GENERAL

C.c.p.- Mtro. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.

MABC/IPE.




REPORTE DE AVANCE DE BIENES

<p align="center">2018</p> <p align="center">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>	DATOS DEL REMITENTE		ENTRADA DE BIENES																
	NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" colspan="3">FECHA</td> <td align="center" colspan="2">NO. REPORTE</td> </tr> <tr> <td align="center">8</td> <td align="center">3</td> <td align="center">2018</td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td align="center">DÍA</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">AÑO</td> <td align="center">HOJA</td> <td align="center">DE</td> </tr> </table>		FECHA			NO. REPORTE		8	3	2018	1	1	DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE
	FECHA			NO. REPORTE															
	8	3	2018	1	1														
DÍA	MES	AÑO	HOJA	DE															
DOMICILIO: Conocido S/N El Saucillo, Huichapan, Hidalgo		DATOS DEL TECNOLÓGICO																	
MUNICIPIO: Huichapan		NOMBRE: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan																	
NO. FACTURA		Domicilio conocido S/N el Saucillo, Huichapan																	
		ESTADO: Hidalgo																	
PROGRAMA Y AÑO: 2016		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL: 1614	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL: 1580																
FEDERAL: \$ 5,005,255.08		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META: 0%																	
ESTATAL: \$0		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA META: 10%																	
TOTAL: \$5,005,255.08																			

DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
<p>A la fecha que se reporta, ITESHU realizó la integración del equipamiento con el estudio de mercado. INAFED ha validado el expediente, INHIFE ha realizado el proceso de adjudicación al proveedor.</p>				
IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO				
IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO				


COMENTARIOS:

El ITESHU ha realizado la integración del expediente con los costos del mercado, actualmente INHIFE como organo estatal, se encuentra en la validación del expediente para llevar a cabo el proceso de adquisición.

FORMULO
NOMBRE Mtra. Imelda Pérez Espinoza
CARGO Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRÓNICO: iperez@iteshu.edu.mx
TELÉFONO 01761 72 48079-80-83
FIRMA 

RECEPCION FISICA
NOMBRE
CARGO
FIRMA

CONFORMIDAD JEFE LABORATORIO
NOMBRE
CARGO
FIRMA

AUTORIZO EL DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE Ing. María Angélica Bravo Cadena
FIRMA 
SELLO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2018
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DOMICILIO COMPLETO: CONOCIDO SA EL SAUCILLO HUICHAPAN, HIDALGO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 5 DIA, 6 MES, 17 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIA, 3 MES, 18 AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 9 DIA, 3 MES, 2018 AÑO

SECRETARÍA DE PLANTACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO


PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
ESCUELAS AL CIEN/2018	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN, MUNICIPIO DE HUICHAPAN, ESTADO DE HIDALGO C.C.T. 13EIT0002C	\$ 24,994,744.92	\$ -	\$ 23,334,488.63	51.00%	\$ 12,747,319.91	1866	1580	70.00%	CONTRATO No. 13-INHIFE-FAMES-ESC-100-16-021-2017 L.P.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

El proceso de adjudicación, seguimiento y entrega de la obra, lo lleva a cabo el organismo constructor del Estado, INHIFE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Ing. Inés María Pérez Espinosa
CARGO: Directora de Planeación y Vinculación
CORREO ELECTRONICO: ine@colchihuix.mx
TEL. 10 DIGITOS: 01 781 72 48078-00-03

FIRMA: 

NOMBRE:

Ing. Andrés Amador Baeza Cortés

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA: 



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS (ESPECIFICAR)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016))

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

C.C.T. 13EIT0002C

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

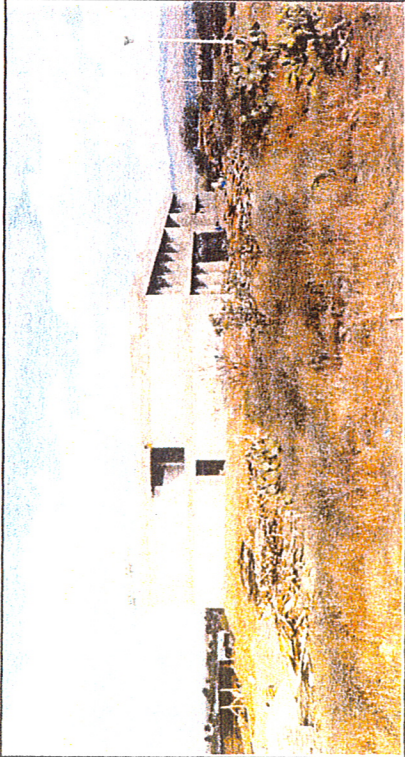
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN.
AVANCE A LA FECHA.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN.
(AVANCE A LA FECHA)

[Handwritten signature]
Feb 2018

Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE)

Avance de la obra de escuelas al cien 2016

Fecha: 08 de marzo de 2018

Nombre de la Institución: Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

Fecha de inicio de la obra: 5 de junio de 2017

Fecha de terminación tentativa de la obra: Marzo de 2018

Recurso asignado: \$24,994,744.92

Datos de la obra:

Obra / Equipamiento	Monto Asignado	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Contrato/pedido por concepto del proyecto o meta autorizada	Avance físico de la obra	Avance financiero	Acta de entrega recepción
*Obra	\$24,994,744.92	\$12,747,319.91	\$12,247,425.01	CONTRATO No. 13-INHIFE-FAMES-ESC100-16-021-2017 L.P.	70%	51%	-
Equipamiento	\$5,005,255.08	\$0	\$5,005,255.08	En proceso	10%	0%	-
